


CAR/SAM REGIONAL PLANNING AND IMPLEMENTATION GROUP / GRUPO REGIONAL CAR/SAM DE PLANIFICACION Y EJECUCION (GREPECAS)  
 CNS/ATM/SG PROJECT/PROYECTO C1  
 AUTOMATION PROJECT FOR THE CAR/SAM REGIONS  
 PROYECTO DE AUTOMATIZACION PARA LAS REGIONES CAR/SAM

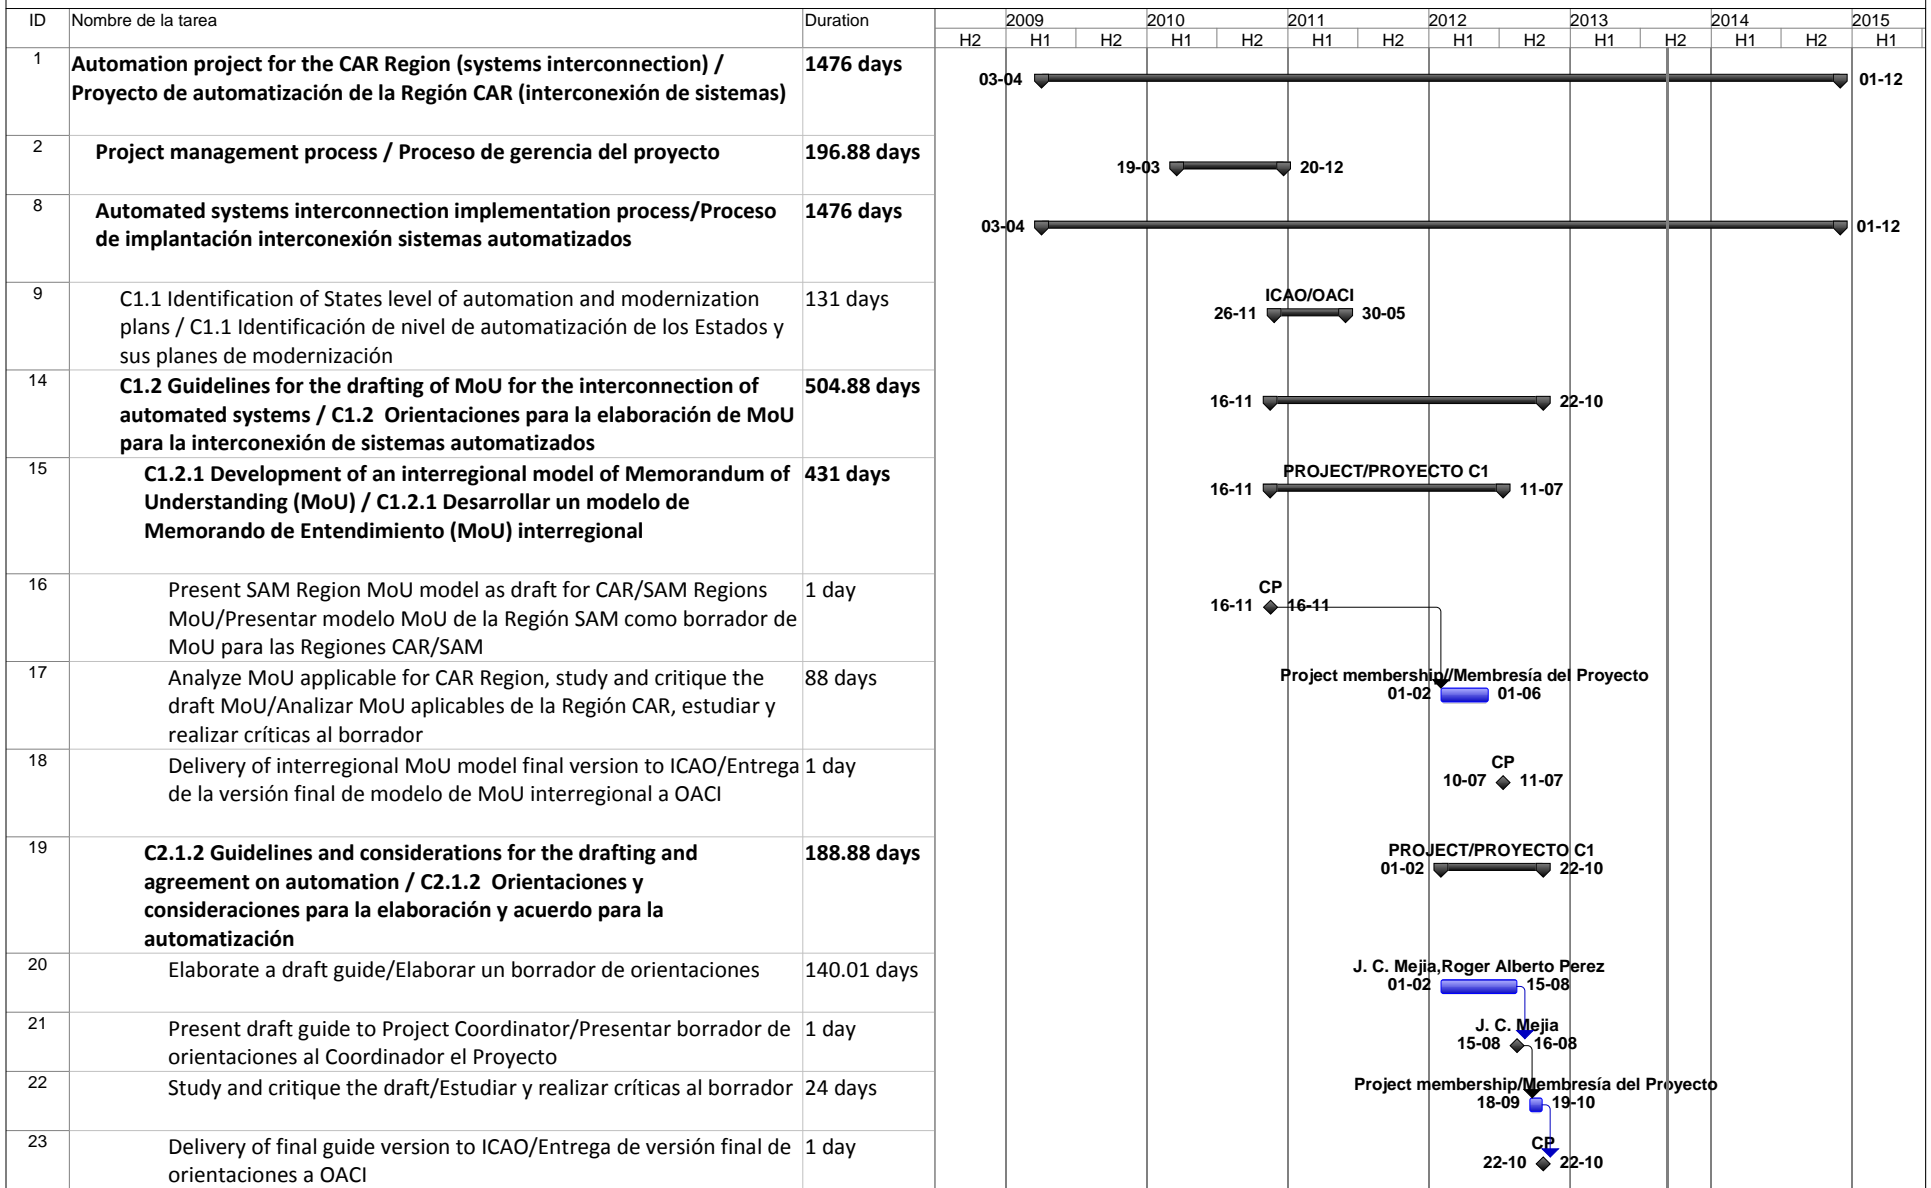

CAR/SAM REGIONAL PLANNING AND IMPLEMENTATION GROUP / GRUPO REGIONAL CAR/SAM DE PLANIFICACION Y EJECUCION (GREPECAS)  
 CNS/ATM/SG PROJECT/PROYECTO C1  
 AUTOMATION PROJECT FOR THE CAR/SAM REGIONS  
 PROYECTO DE AUTOMATIZACION PARA LAS REGIONES CAR/SAM

ID	Nombre de la tarea	Duration	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015
			H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	
24	<b>C1.3 Monitor flight plan data process implementation, electronic transmission tools &amp; automatic ATS message exchange / C1.3 Monitorear implantación sistema proceso datos plan vuelo, herramientas transmisión electrónica e intercambio automático msgs ATS</b>	<b>373.88 days</b>								01-03	06-08				
25	<b>C1.3 Proposals/flight plan data process implementation, electronic transmission tools &amp; automatic ATS message exchange / C1.3 Monitorear implantación sistema proceso datos plan vuelo, herramientas transmisión electrónica e intercambio automático msgs ATS</b>	<b>373.88 days</b>								01-03	06-08				
26	Identify various group States technological levels, including interconnection means/Identificar los diferentes niveles tecnológicos de grupos de Estados, incluyendo medios de interconexión	110.5 days								01-03	02-08				
27	Presentation of draft to Project Coordinator/Presentar al Coordinador de Proyecto el borrador	1 day									02-08	03-08			
28	Review of draft/Criticar el borrador	23 days									23-10	22-11			
29	Consolidation of final document at technological levels/Consolidar un documento final con los niveles tecnológicos	43 days									23-11	22-01			
30	Elaborate draft document with guidelines on improvement for each State group level/Elaborar borrador de documento con orientaciones de mejora para cada grupo de niveles de Estados	221 days								25-05	29-03				
31	Present the Project Coordinator with guidelines draft/Presentar al Coordinador de Proyecto el borrador de orientaciones	1 day									01-04	01-04			
32	Review of guidelines draft/Criticar el borrador de orientaciones	24 days									02-04	03-05			
33	Elaboration of final document/Elaborar el documento final	65 days									06-05	02-08			
34	Delivery of final document to Project Coordinator/Entregar el documento final al Coordinador de Proyecto	1 day									05-08	05-08			
35	Delivery of final document to ICAO/Entrega del documento final a OACI	1 day									06-08	06-08			

PM = Programme Manager/Gerente Programa  
 PC = Project Coordinator/Coordinador Proyecto

CAR/SAM REGIONAL PLANNING AND IMPLEMENTATION GROUP / GRUPO REGIONAL CAR/SAM DE PLANIFICACION Y EJECUCION (GREPECAS)  
 CNS/ATM/SG PROJECT/PROYECTO C1  
 AUTOMATION PROJECT FOR THE CAR/SAM REGIONS  
 PROYECTO DE AUTOMATIZACION PARA LAS REGIONES CAR/SAM

ID	Nombre de la tarea	Duration	2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
			H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1	H2	H1		
36	<b>C1.4 Monitor ATM automation implementaion and exchange of surveillance data/C1.4 Monitorear la implantación de automatización ATM y el intercambio de datos de vigilancia</b>	<b>900 days</b>														
37	<b>C1.5 Monitor implementation of additional/advanced automation support tools/C1.5 Monitorear implantación herramientas de apoyo adicionales/avanzadas de automatización</b>	<b>1236 days</b>														
38	C1.5.1 Proposals/guidelines use and benefit additional/advanced automation support tools increase aero info sharing/C1.5.1 Propuesta/orientacion uso y beneficios herramientas apoyo adicional/avanzada automatización incremento compartición info aeronáutica	1236 days														
39	<b>C1.6 Monitor the implementation development/C1.6 Monitorear el desarrollo de la implementación</b>	<b>1226 days</b>														

