



ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL

Proyecto RLA/03/902 – "Transición al GNSS en las Regiones CAR/SAM – SACCSA"
Séptima Reunión del Comité de Coordinación (RCC/7)
(San Carlos de Bariloche, Argentina, 11 al 15 de octubre de 2010)

**Cuestión 9 del
Orden del día:**

**Otros asuntos
9.2 Tareas en curso y pendientes**

CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LOS PAQUETES DE TRABAJO DE LA FASE III-A Y PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO SACCSA

(Nota presentada por la Secretaría)

RESUMEN

Esta nota de estudio presenta el calendario de ejecución de los paquetes de trabajo de la Fase III-A en curso y pendientes, así como una propuesta del Programa anual de actividades del Proyecto para el ciclo Octubre 2010 – 2011.

1. INTRODUCCIÓN

1.1 La duración de la ejecución de la Fase III del Proyecto RLA/03/902 – SACCSA fue estimada en 24 meses. Producto de los resultados del proceso de licitación y de contratación del Consorcio industrial seleccionado y de subcontratación de los paquetes de trabajo a las empresas que integran el Consorcio, la ejecución de los paquetes de trabajo comenzó en enero de 2010.

1.2 En el Apéndice A de la NE/07 de esta Reunión fue presentado el programa de actividades relacionadas con el Proyecto que fueron desarrolladas durante el ciclo 2009 – 2010. El Apéndice mencionado puede utilizarse como referencia y seguimiento de las actividades de la Fase III del Proyecto por esta Reunión al preparar el programa de actividades para el Ciclo Octubre 2010 – 2011.

2. DISCUSIÓN

2.1 Se puede constatar que la ejecución de los paquetes de trabajo de la Fase III se encuentran en una etapa intermedia y concluirían en el 2012. El Calendario de realización de los paquetes de trabajo de la Fase III-A que muestra las tareas en curso y pendientes y actividades vinculadas se muestra en el **Apéndice A** de esta nota de estudio.

2.2 Basado en las informaciones y propuestas presentadas en la documentación de esta Reunión, el Proyecto SACCSA durante el Ciclo Octubre 2010 – 2011 deberá ejecutar actividades relacionadas con las cuestiones principales siguientes: continuación de la ejecución de los paquetes de trabajo, contribuciones al mecanismo del GREPECAS, coordinación y ejecución del Programa de contribuciones en especie, presentación y difusión internacional del Proyecto ante grupos de expertos, de directores de aviación civil, organizaciones y otras entidades internacionales vinculadas con el progreso del GNSS. En el **Apéndice B** de esta nota se presenta una propuesta de Programa general de actividades del Proyecto para el Ciclo Octubre de 2010 – 2011 (hasta la celebración de la RCC/8).


2.3 Es importante que la Reunión revise, complete y adopte los programas que se presentan en los Apéndices A y B de esta nota.

3. ACCIÓN SUGERIDA

3.1 Se invita a la Reunión a:

- a) tomar nota de la información contenida en esta nota de estudio;
- b) revisar y adoptar el Calendario de ejecución de los paquetes de trabajo de la Fase III-A en curso y pendientes que se presenta en el Apéndice A de esta nota; y
- c) revisar y adoptar el Programa general de actividades del Proyecto para el Ciclo Octubre de 2010 – 2011 (hasta la celebración de la RCC/8) que se presenta en el Apéndice B de esta nota.

CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LOS PAQUETES DE TRABAJO DE LA FASE III-A PROYECTO RLA/03/902 – SACCSA

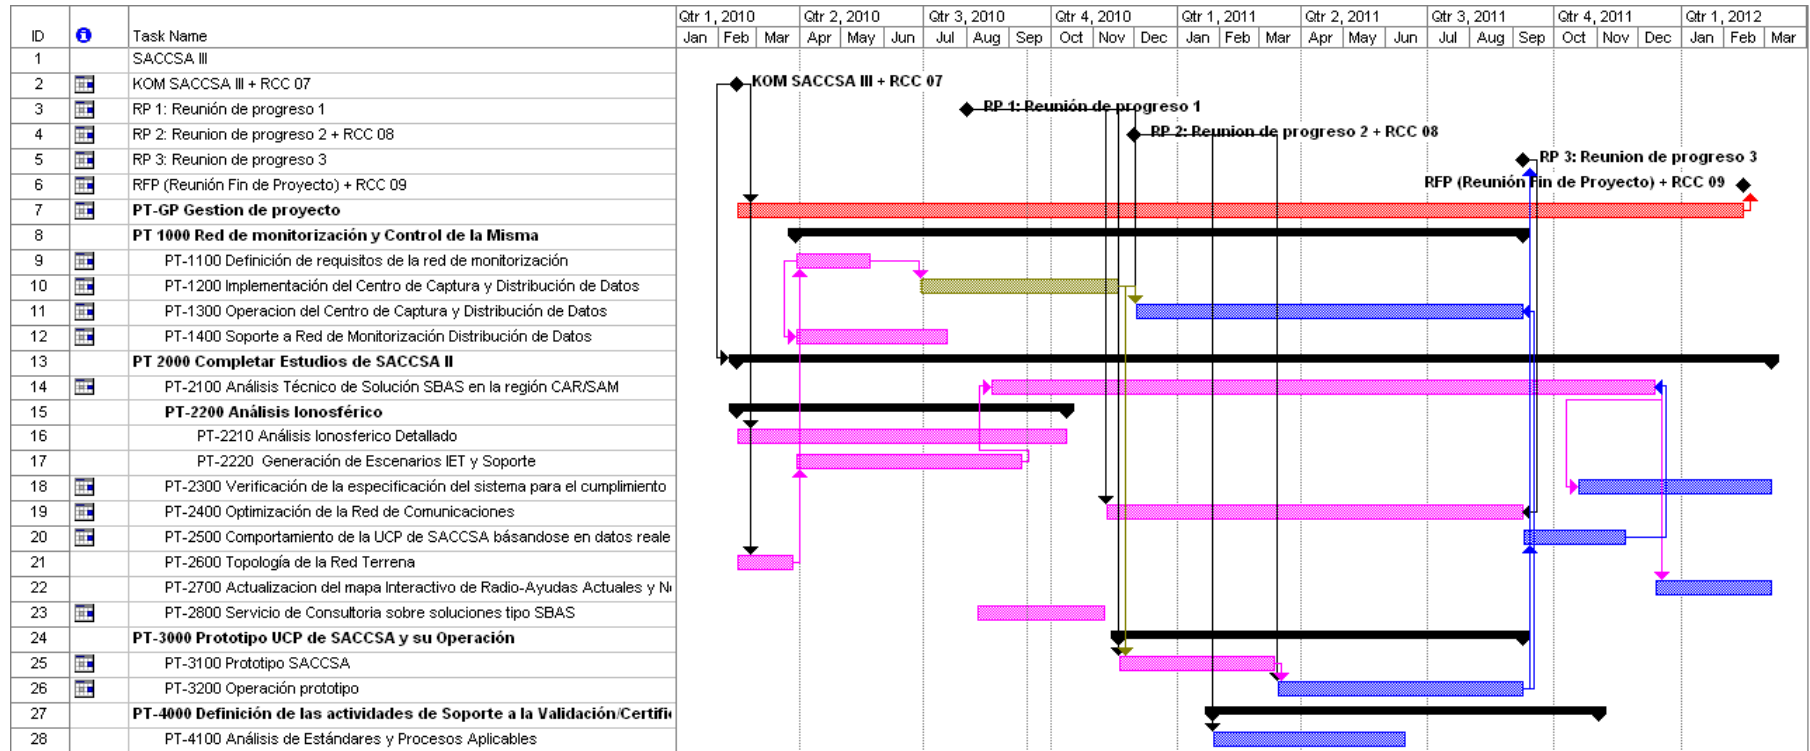

APÉNDICE A

Notar que se han marcado los diferentes paquetes de trabajo de acuerdo a:

- **Fucsia:** aquellos paquetes de trabajo contratados en la etapa “Contratación Inmediata”
- **Verde:** aquellos paquetes de trabajo contratados en la etapa “Contratación Urgente”
- **Azul:** aquellos paquetes de trabajo contratados en la etapa “Tercer Bloque a Contratar”
- **Rojo:** Paquete de trabajo de gestión aplicable a todas las etapas.

APÉNDICE B

TABLA 1: PROPUESTA DE PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO RLA/03/902 – SACCSA. CICLO OCTUBRE DE 2010 – 2011 (HASTA LA RCC/8)				
Ref.	Actividad	Lugar	Fecha	
			Comienzo	Fin
1	Séptima Reunión del Comité de Coordinación (RCC/7)	Bariloche, Argentina	11/10/10	15/10/10
2	Continuación de la ejecución de los Paquetes de trabajo de la Fase III-A	–	Oct. 10	→
3	Continuación de contrataciones y sub-contrataciones de Paquetes de Trabajo con el Consorcio	Montreal, Canadá y Madrid, España	Oct. 10	→
4	Presentación del Proyecto en la 23ava Reunión de Directores de Aviación Civil del Caribe Oriental	Barbados	9/11/10	12/11/10
5	Presentación del estado de la Fase III y contribuciones del Proyecto en la Segunda Reunión del Subgrupo CNS/ATM del GREPECAS (CNS/ATM/SG/2)	Ciudad de México, México	16/11/10	19/11/10
6	Publicación del Boletín No. 3 del Proyecto SACCSA	–	Diciembre 2010	
7	Ejecución del Programa de contribuciones en especie	–	Enero 10	→
8	Presentación estado del Proyecto en la 95ª Reunión DGACs de Centroamérica (DGAC/CAP/95)	La Antigua, Guatemala	08/02/11	10/02/11
9	Presentación del Proyecto en la Reunión GREPECAS/16	Punta Cana, Rep. Dom.	28/03/11	09/04/11
10	Tercera Reunión del Grupo de trabajo de Norteamérica, Centroamérica y Caribe (NACC/-WG/3)	Guatemala	02/05/11	06/05/11
11	Duodécima Reunión de Autoridades de Aviación Civil (RACC/12), región SAM	Será determinado	Será determinado	Será determinado
12	Otras reuniones de la región SAM	Será determinado	Será determinado	Será determinado

TABLA 1: PROPUESTA DE PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO RLA/03/902 – SACCSA. CICLO OCTUBRE DE 2010 – 2011 (HASTA LA RCC/8)				
Ref.	Actividad	Lugar	Fecha	
			Comienzo	Fin
13	Cuarta Reunión de Directores de Aviación Civil de Norteamérica, Centroamérica y Caribe (NACC/DCA/4)	Honduras	20/06/11	24/06/11
14	Publicación del Boletín No. 4 del Proyecto SACCSA	–	Será determinado	
15	Presentación y difusión internacional del Proyecto ante otros grupos de expertos, organizaciones y entidades internacionales GNSS	Será determinado	Será determinado	Será determinado
16	Presentación del Proyecto en otras reuniones internacionales	Será determinado	Será determinado	Será determinado
17	Reunión RCC/8 del Proyecto	Será determinado	Será determinado	Será determinado
