CAR/SAM REGIONAL PLANNING AND IMPLEMENTATION GROUP / GRUPO REGIONAL CAR/SAM DE PLANIFICACION Y EJECUCION (GREPECAS)
ATN INFRASTRUCTURE AND GROUND-GROUND AND AIR-GROUND APPLICATIONS / INFRAESTRUCTURA ATN Y SUS APLICACIONES TIERRA-TIERRA Y TIERRA-AIRE

ID	Task Name	Duration
1	**PROJECT: ATN INFRASTRUCTURE FOR THE CAR REGION AND ITS G/G AND A/G APPLICATIONS/ INFRAESTRUCTURA ATN EN LA REGION CAR Y SUS APLICACIONES TIERRA-TIERRA Y TIERRA-AIREAUTOMATIZACIÓN**	**1357 days**
2	**ATN INSTRUCTURE FOR CAR REGION/INFRAESTRUCTURA ATN PARA LA REGION CAR**	**876 days**
30	**ATN GROUND-GROUND AND AIR-GROUND APPLICATIONS/ A**	**1357 days**
31	**2.1 Review, update and complete initial transition plan for the evolutionary development of ATN and applications / Revisar, actualizar y completar el plan de transición inicial para el desarrollo evolutivo de la ATN y sus aplicaciones**	**796 days**
36	**2.2 Implementation Plan for ATN Ground-ground applications (AMHS) / Plan de implantación de las Aplicacion tierra-tierra del ATN (AMHS)**	**722 days**
37	**DELIVERABLE: Implementation Plan for Ground-ground ATN Applications (AMHS) / Plan de implantación de las aplicación tierra-tierra del ATN (AMHS)**	**722 days**
38	Information collection on technical, operational, transition and other implementation aspects for AMHS / Recolección de información sobre aspectos técnicos, operacionales, de transición e implantación sobre AMHS	590 days
39	Evaluation of information / Evaluación de la información	66 days
40	Draft Plan / Borrador de plan	66 days
41	**2.3 Implementation Plan for ATN Ground-ground applications (AIDC) / Plan de implantación de las aplicaciones tierra-tierra del ATN (AIDC)**	**812 days**
46	**Update proposal for CNS Table 1Bb**	**60 days**
47	**2.4 Coordination and test for ATN ground applications implementation / Coordinación y prueba para aspecto de implantación de aplicaciones tierra tierra de la ATN**	**136 days**
50	**2.5 Monitor VDL implementation trials and its applications / Monitorear iimplementación de ensayos de VDL y sus aplicaciones**	**1067 days**
58	**2.6 Initial transition plan of ground/air ATN application / Plan de transición inicial de las aplicaciones tierra-aire de la ATN**	**30 days**

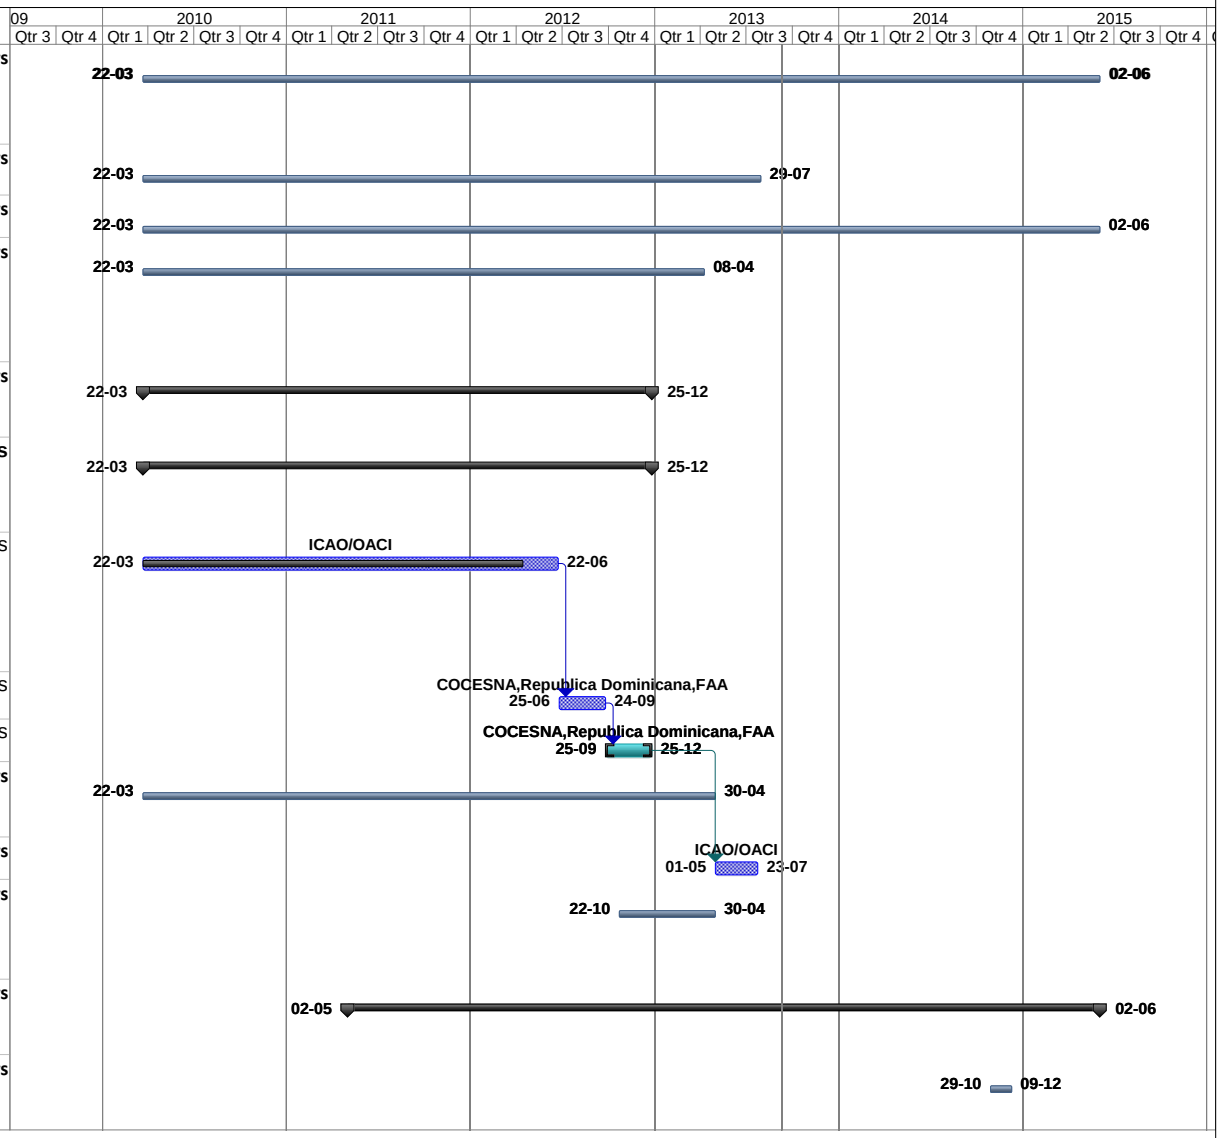

PC = Project Coordinator / Coordinador de Proyecto
PM = Project Members / Miembros de Proyecto
S/T = States/Territories / Estados/Territorios
