GRUPO REGIONAL CAR/SAM DE PLANIFICACION Y EJECUCION / CAR/SAM REGIONAL PLANNING AND IMPLEMENTATION GROUP (GREPECAS)
IMPLANTACION DEL NUEVO MODELO DE PLAN DE VUELO DE LA OACI / IMPLEMENTATION OF THE NEW ICAO FLIGHT PLAN MODEL

ID	Nome da tarefa	Qtr 4	2010 Qtr 1	2010 Qtr 2	2010 Qtr 3	2010 Qtr 4	2011 Qtr 1	2011 Qtr 2	2011 Qtr 3	2011 Qtr 4	2012 Qtr 1	2012 Qtr 2	2012 Qtr 3	2012 Qtr 4	Qtr 1
1	**Implantación del nuevo modelo de plan de vuelo de la OACI / Implementaion of the new ICAO Flight Plan Model**		19-03											15-11	
2	**Project management process / Proceso de gerencia del proyecto**		19-03	14-06											
3	Define Project Manager/Definir el Gerente de Proyecto		CP 19-03	19-03											
4	Identify States experts/Identificar expertos de los Estados		CP 19-03	14-06											
5	**Guias sobre la transicion al nuevo formato de plande vuelo presentado / Guidelines on transition to new flight plan format**		19-03	25-05											
6	Guía sobre identificación de los sistemas afectados con el NUEVO FPL/Guideline to identify the automated system affected by the NEW FPL		CP,ICAO / OACI 19-03	21-04											
7	Modelo de plan de acción para la implnatación del NUEVO FPL por los Estados/Model of action plan for States in the implementaion of the NEW FPL		CP,ICAO / OACI 19-03	25-05											
8	Guia sobre la implanatación del NUEVO FPL durante el periodo de transicion/Guidelines for the implementaion of the NEW FPL during the transition phase		OACI/ICAO 19-03	24-05											
9	**Elaborar una estrategia regional de transicion al nuevo formato de plan de vuelo / Develop regional strategy for transition to new flight plan format**		ICAO/OACI 19-03				01-04								
10	Elaboración estrategia regional y aprobación por GREPECAS		CP,ICAO / OACI 19-03				01-04								
11	**Analisis consolidado de las evaluaciones realizadas por los Estados de los posiblesimpactos de la implementacion del nuevo formato de FPL/Consolidatedanalysisi on assessments made by States on possible impacts in the implemntation of the new FPL**			24-05	15-10										
12	Identificación de los posibles impactos/Posible impact identificat		Estados SAM/ SAM States 24-05	24-06											
13	Recolectar las evaluaciones/Collect the evaluation			Estados SAM/ SAM States 01-07	31-08										
14	Análisis consolidado de las evaluaciones realizadas por los Estadc				ICAO / OACI,CP 06-09	30-09									
15	Elaboración de informe con el análisis consolidado de las evaluaciones realizadas por los Estados/Consolideted analysis on assessments made by States on possible impacts in the implementaion of the NEW FPL				ICAO / OACI,CP 04-10	15-10									
16	**Propuesta de consideraciones para realizar los ensayos entre sistemas con capacidad de procesamiento del nuevo plan de vuelo/Proposed considerations to conduct trials between systems with the new flight plan processing capacity**						CP,ICAO / OACI 11-05						02-07		
17	Propuesta de consideraciones para realizar los ensayos entre sistemas con capacidad de procesamiento del nuevo plan de vuelo/Proposed considerations to conduct trials between systems with the capacity to process the new flight plan						O. Goaurnalusse (Argentina),CP 11-05	23-05							

PM = Programme Manager/Gerente Programa
CP = Project Coordinator/Coordinador Proyecto

GRUPO REGIONAL CAR/SAM DE PLANIFICACION Y EJECUCION / CAR/SAM REGIONAL PLANNING AND IMPLEMENTATION GROUP (GREPECAS)
IMPLANTACION DEL NUEVO MODELO DE PLAN DE VUELO DE LA OACI / IMPLEMENTATION OF THE NEW ICAO FLIGHT PLAN MODEL

ID	Nome da tarefa	Qtr 4	2010 Qtr 1	2010 Qtr 2	2010 Qtr 3	2010 Qtr 4	2011 Qtr 1	2011 Qtr 2	2011 Qtr 3	2011 Qtr 4	2012 Qtr 1	2012 Qtr 2	2012 Qtr 3	2012 Qtr 4	Qtr 1
18	Realizacion de ensayos /Conduct trials														
19	**Elaboracion de procedimientos de contingencia y determinacion de consideraciones técnico/operacionales para la transicion/Development of contingency procedures and determination of operational /techical considerations for the transitions**														
20	Elaboración de una guía con consideraciones para la elaboración de los procedimientos de contingencias/Preparation of a guideline with considerations for the development of contingency procedures														
21	Elaboración de los procedimientos de contingencias/Developmer														
22	**Propuesta de consideraciones tecnicas /operacionales para la transicion /Technical/operational proposals for the transition**														
23	Lista de publicación de acciones de transición, ensayos y otras publicaciones para los usuarios e interesados/Publication lists of the transition actions, trials and other publications for the users and stakeholders														
24	Elaboracion Modelo AIC /AIC Model Elaboration														
25	Publicación de acciones de transición/Publication of transition actions														
26	Propuesta de consideraciones técnicas/operacionales para la transición/Proposed technical/operational considerations for the transition														
27	Plan de capacitación /Training Plan														
28	Implantacion Plan de Capacitación/Training Plan Implementation														
29	Plan de transición/Conduct a transition plan														
30	Evaluación de las acciones de transición y hacer ajustes/Assessment of the transition actions and make adjustments														
31	**NUEVO FPL implementado/NEW FPL implemented**														
32	NUEVO FPL implementado/NEW FPL implemented														
33	**Monitorear las actividades de implantacion del nuevo formato de plan de vuelo en la Region SAM /Monitor the implemnetation of the new ICAO flight plan model activities in the SAM Region**														
34	Monitorear las actividades de implantacion del nuevo formato de plan de vuelo en la Region SAM/Monitor the implemnetation of the new ICAO flight plan model activities in the SAM Region														

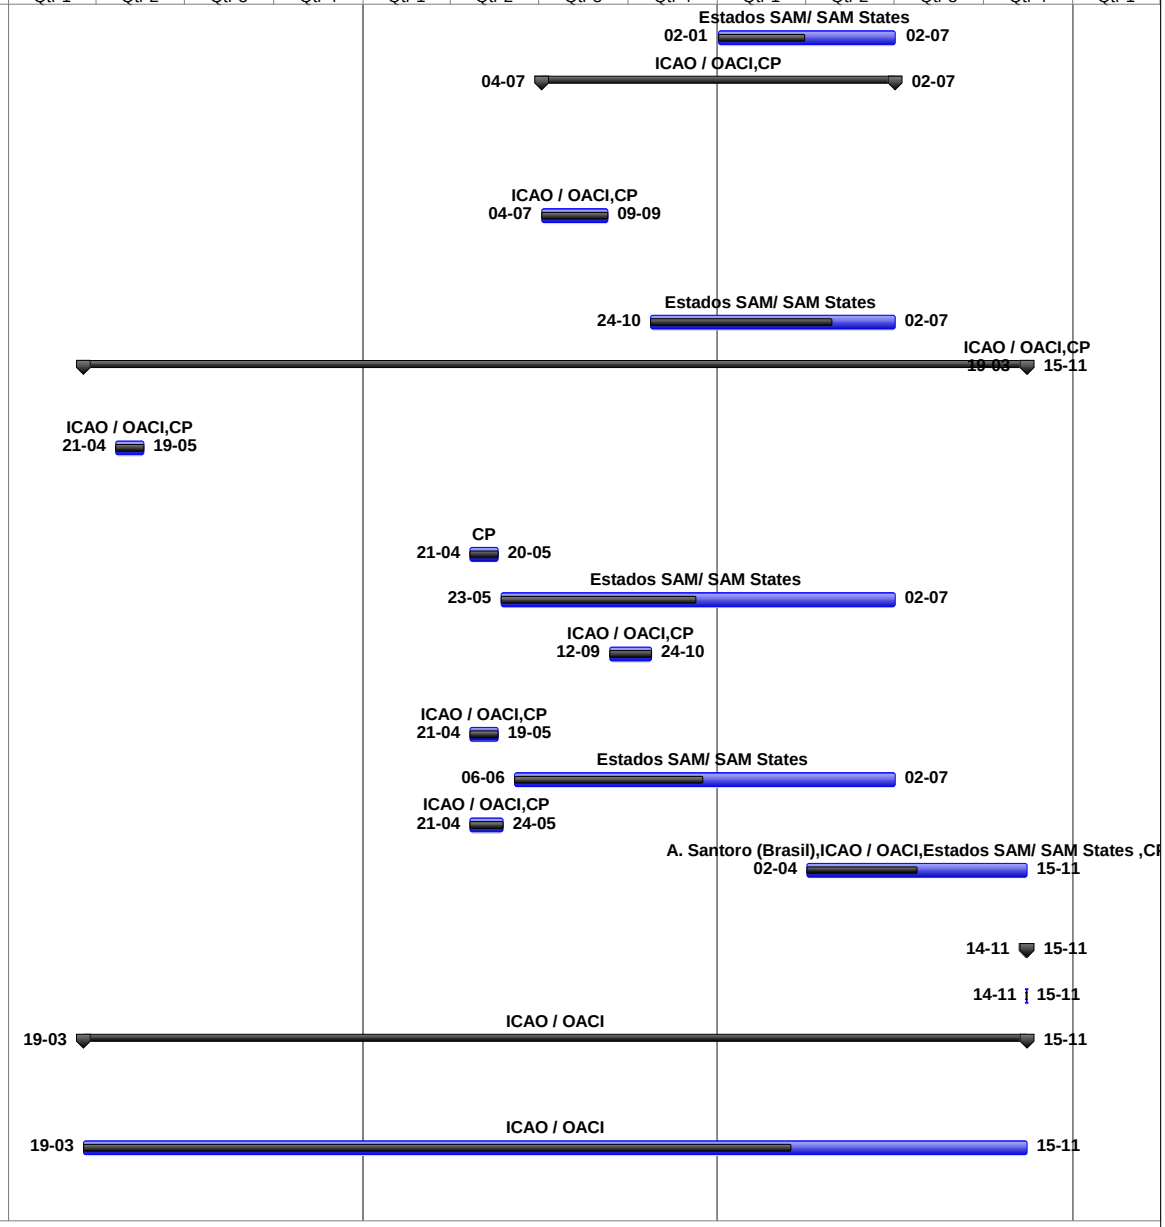

PM = Programme Manager/Gerente Programa
CP = Project Coordinator/Coordinador Proyecto
